



# *Capítulo 2*

# **Integración, Alcance y Cierre**

*Unidad 5 – Administración de Recursos en Proyectos IT*


# Índice

- Visión Integral de un Proyecto
- Gestión de Integración del Proyecto
- Gestión de Alcance del Proyecto


*Integración, Alcance y Cierre*

# Visión Integral de un Proyecto

# Grupos de Procesos del PMI

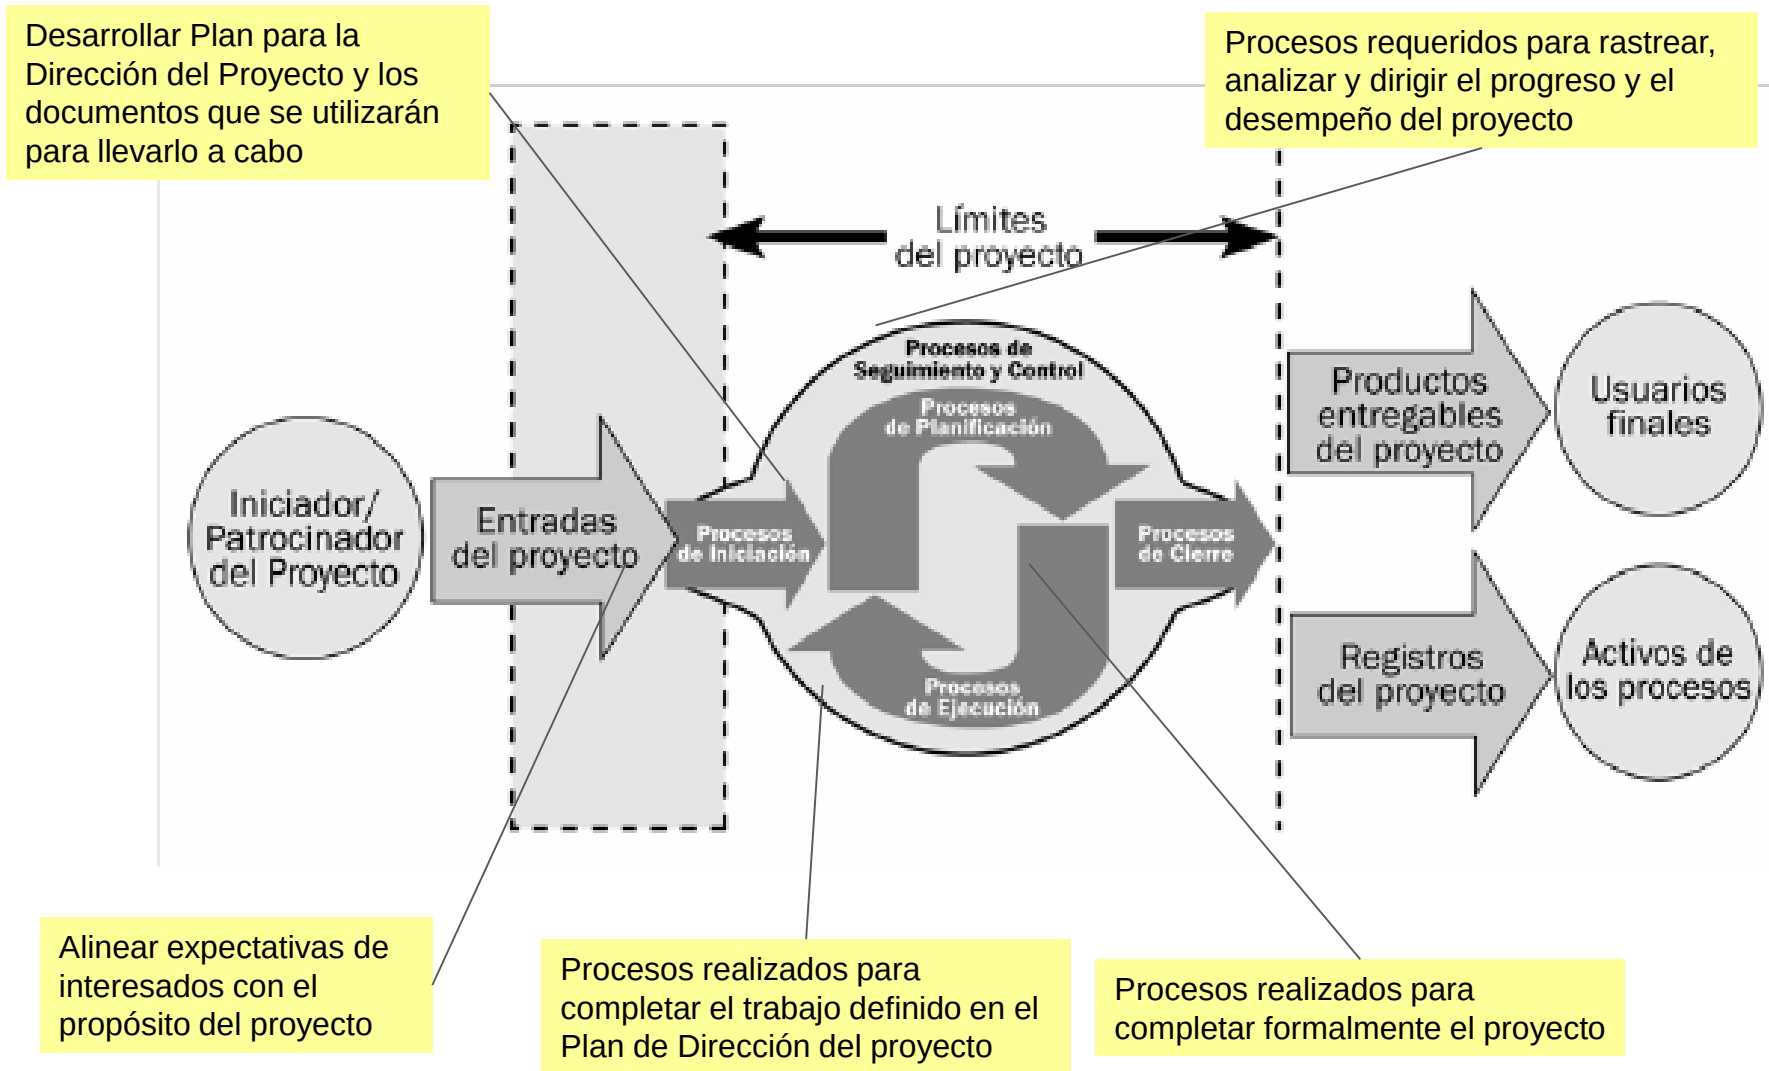

# Los grupos de procesos interactúan en el proyecto

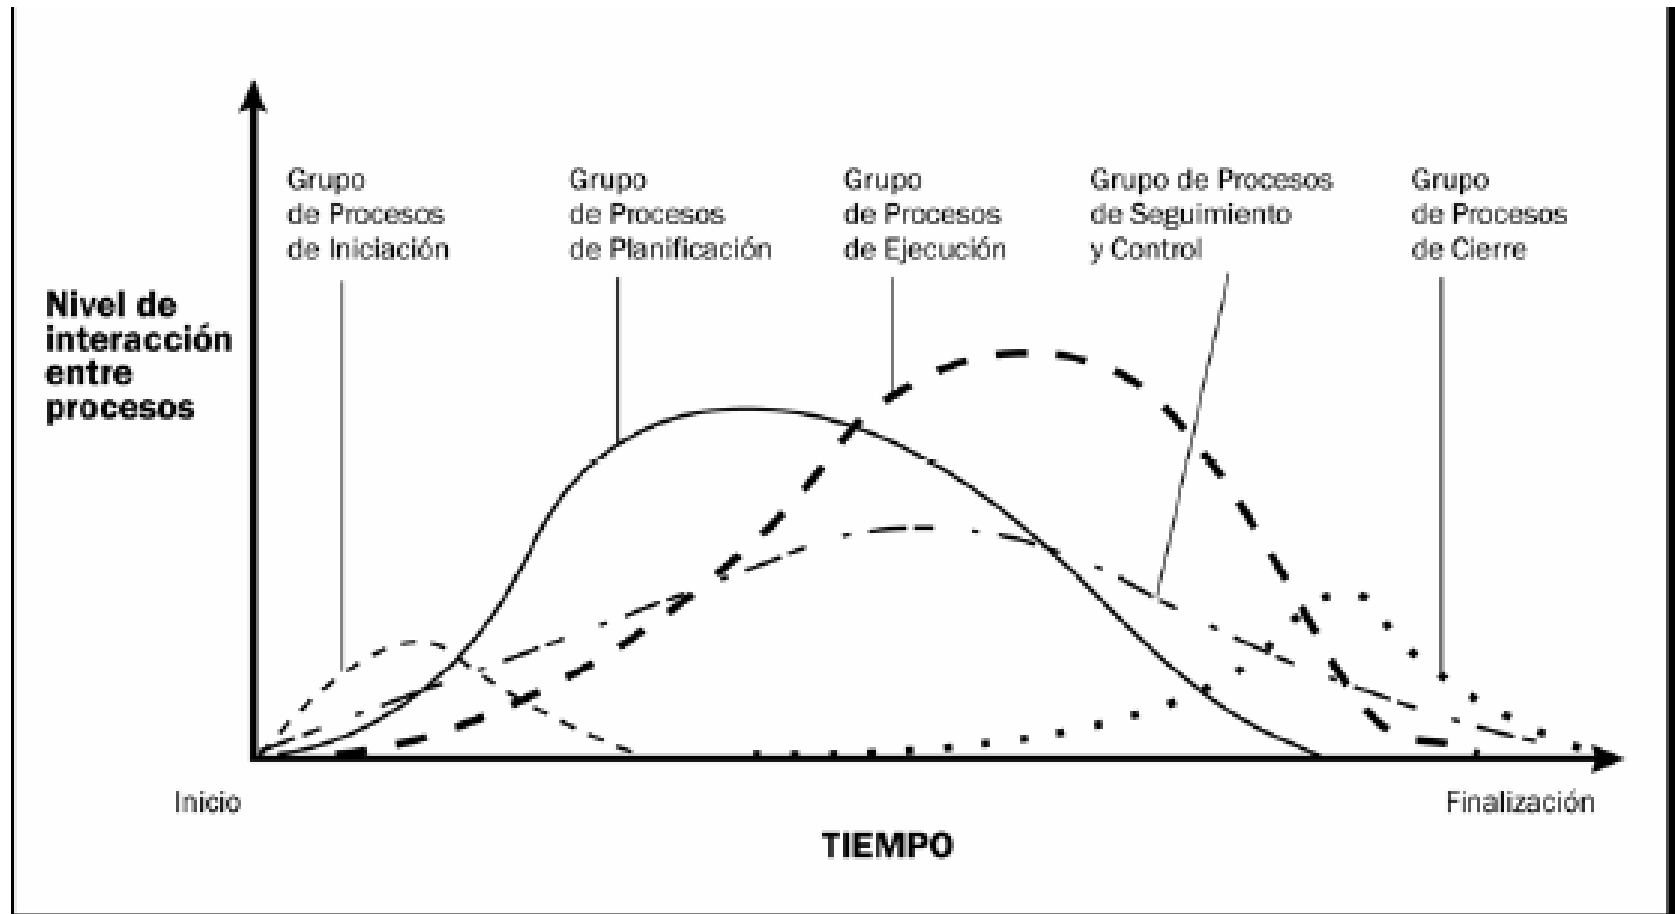

# Relación entre áreas de conocimiento, grupos de procesos y procesos

|                         | INICIACION                                                 | PLANIFICACIÓN                                                                                                                                               | EJECUCIÓN                                                           | CONTROL                                                               | CIERRE                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>INTEGRACION</b>      | 1. Acta de Proyecto<br>2. Enunciado Preliminar del Alcance | 1. Plan de Gestión                                                                                                                                          | 1. Dirigir y gestionar ejecución del PRY                            | 1. Supervisar y controlar el trabajo del PRY<br>2. Control de Cambios | 1. Cerrar el Proyecto o la fase |
| <b>ALCANCE</b>          |                                                            | 2. Planificación Alcance<br>3. Definición del Alcance<br>4. WBS o EDT                                                                                       |                                                                     | 3. Verificación Alcance<br>4. Control del Alcance                     |                                 |
| <b>TIEMPOS</b>          |                                                            | 5. Definición de Actividades<br>6. Establecimiento de la secuencia<br>7. Estimación de recursos<br>8. Estimación de duración<br>9. Cronograma               |                                                                     | 5. Control del Cronograma                                             |                                 |
| <b>COSTOS</b>           |                                                            | 10. Estimación de Costos<br>11. Presupuesto                                                                                                                 |                                                                     | 6. Control de Costos                                                  |                                 |
| <b>CALIDAD</b>          |                                                            | 12. Planificación de la Calidad                                                                                                                             | 2. Realizar Aseguramiento de Calidad                                | 7. Control de Calidad                                                 |                                 |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b> |                                                            | 13. Planificación de Recursos Humanos                                                                                                                       | 3. Adquirir equipo de PRY<br>4. Desarrollar equipo de PRY           | 8. Gestionar el equipo del Proyecto                                   |                                 |
| <b>COMUNICACIONES</b>   |                                                            | 14. Planificación de las Comunicaciones                                                                                                                     | 5. Distribución de la Información                                   | 9. Informar rendimiento<br>10. Gestionar interesados                  |                                 |
| <b>RIESGOS</b>          |                                                            | 15. Planificación de la Gestión de Riesgos<br>16. Identificación<br>17. Análisis Cualitativo<br>18. Análisis Cuantitativo<br>19. Planificación de respuesta |                                                                     | 11. Seguimiento y Control de riesgos                                  |                                 |
| <b>ADQUISICIONES</b>    |                                                            | 20. Planificar las compras y adquisiciones<br>21. Planificar la contratación                                                                                | 6. Solicitar respuestas de vendedores<br>7. Selección de Vendedores | 12. Administración del Contrato                                       | 2. Cierre del Contrato          |



*Integración, Alcance y Cierre*

# Gestión de Integración del Proyecto

# Gestión de la Integración de Proyectos

Describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos **elementos** de la dirección de proyectos, que se **identifican, definen, combinan, unen y coordinan** dentro de los **Grupos de Procesos** de Dirección de Proyectos.



# Gestión de la Integración de Proyectos

## **Se basa en los procesos de Dirección de Proyectos:**

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto,
- Desarrollar el Enunciado Preliminar de Alcance del Proyecto,
- Desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto,
- Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto,
- Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto,
- Control Integrado de Cambios
- Cerrar Proyecto o Fase

## ***Acta de Constitución del Proyecto***

- **Autoriza formalmente** el proyecto
- **Confiere** al Director la **autoridad** para aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto
- Preferentemente el **Director del Proyecto** debe ser **nombrado** antes o durante el desarrollo del Acta de Constitución

## Gestión de la Integración de Proyectos

# Acta de Constitución del Proyecto

### ANEXO I – ACTA DE PROYECTO

(Ver template para completar adjunto)

#### ACTA DEL PROYECTO:

indicar nombre del proyecto

ACTA DEL PROYECTO:

Redefinición de la Arquitectura tecnológica para servicios de Base de Datos de la empresa ESABAL S.A.

#### DE:

indicar el nombre y el rol dentro de la organización del patrocinador del proyecto

DE: Miguel Fernández Gerente General de ESABAL S.A.

#### PARA:

Indicar los stakeholders que deberán tener conocimiento del proyecto a desarrollar

PARA:

Integrantes de los Departamentos de la Organización:

- Sistemas – Compras – Financiera – Recursos Humanos

Y el Equipo del Proyecto inicialmente conformado por:

- Juan Pérez, María Rodríguez

## *Enunciado Preliminar del Alcance*

Establece el **trabajo que debe realizarse** y los productos **entregables** que deben producirse.

Es una **primera aproximación al Alcance del Proyecto** que será refinado en las siguientes etapas y una **extensión al Acta de Constitución del Proyecto.**

## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Enunciado Preliminar del Alcance*

- Objetivos del proyecto y del producto
- Requisitos y características del producto o servicio
- Criterios de aceptación del producto
- Límites del proyecto
- Requisitos y productos entregables del proyecto
- Restricciones del proyecto
- Asunciones del proyecto
- Organización inicial del proyecto
- Riesgos iniciales definidos
- Hitos del cronograma
- Estructura de Desglose de Trabajo inicial
- Estimación de costos de orden de magnitud
- Requisitos de gestión de la configuración del proyecto
- Requisitos de aprobación

## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Plan de Dirección del Proyecto*

- Documenta las **acciones que se llevarán a cabo** para preparar, integrar y coordinar todos los planes definidos para la ejecución del mismo
- Se elabora **gradualmente por medio de actualizaciones** y se controla y se aprueba por medio del **proceso de Control de Cambios**

## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Plan de Dirección del Proyecto*

- Seleccionar el **Ciclo de Vida**
- Describir las **herramientas y técnicas** que se utilizarán
- Describir el **modo en que se ejecutará** el trabajo
- Definir el **Plan de Gestión de Cambios**
- Definir el **Plan de Gestión de Configuraciones**
- Definir cómo se realizará la **medición del desempeño** en función de las líneas base,
- Definir las **necesidades y las técnicas de comunicación** entre los interesados
- Definir las **revisiones** clave de **alcance, tiempo y costos**



## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Plan de Dirección del Proyecto*

#### **Líneas Base**

- *Cronograma de Tiempos*
- *Presupuesto de Costos*
- *Alcance*

#### **Planes Subsidiarios**

- *Gestión de Calidad*
- *Recursos humanos*
- *Gestión de las comunicaciones*
- *Gestión de riesgos*
- *Gestión de las adquisiciones*

## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto*

- **Ejecutar** las actividades
- Crear **entregables**
- Realizar reuniones de **capacitación y dirección**
- Realizar la gestión y utilización de **recursos**
- Implementar **métodos y normas** planificados
- Gestionar los **canales de comunicación**
- Generar datos a fin de facilitar **proyecciones**
- Emitir las **solicitudes de cambio** y **adaptar las líneas base**
- Implementar acciones en **respuesta a riesgos**
- Administrar la **relación con vendedores y proveedores**
- Recopilar y documentar las **lecciones aprendidas** e implementar las **actividades** aprobadas de **mejora** del proceso

## Gestión de la Integración de Proyectos

### *Monitorear y Controlar el trabajo del Proyecto*

- Comparar el **desempeño real** con respecto al **planificado**
- Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de **acciones preventivas o correctivas**
- Gestionar proactivamente **riesgos**
- Mantener, durante la ejecución del proyecto, una **base de información precisa** y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y su **documentación relacionada**
- Proporcionar la información necesaria para sustentar el **informe de estado, la medición del avance y las proyecciones**
- Proporcionar **proyecciones que permitan actualizar** la información relativa al **costo y al cronograma** actuales
- Monitorear la implementación de los **cambios aprobados**

## Gestión de la Integración de Proyectos

*Control de Cambios*

- Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, de modo que **únicamente se implementen cambios aprobados**,
- Revisar, analizar y **aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida**, lo cual es esencial, ya que una decisión tardía puede influir negativamente en el tiempo, el costo o la viabilidad de un cambio,
- **Gestionar los cambios** aprobados,
- Mantener la **integridad de las líneas base**, incorporando al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto únicamente los cambios aprobados,
- Revisar, aprobar o rechazar todas las **acciones preventivas y correctivas** recomendadas,
- **Coordinar los cambios** a través de todo el proyecto (por ejemplo, un cambio propuesto en el cronograma a menudo influirá en el costo, el riesgo, la calidad y los recursos humanos),
- Documentar el **impacto** total de las **solicitudes de cambio**.

## Gestión de la Integración de Proyectos

*Cierre del Proyecto o Fase*

Es el Proceso que finaliza todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.


Incluye todas las **actividades necesarias para el cierre administrativo del proyecto o fase**, incluyendo metodologías paso a paso relativas a:

- acciones y actividades necesarias para satisfacer los **criterios de terminación** o salida de la fase o del proyecto
- acciones y actividades necesarias para **transferir los productos, servicios o resultados del proyecto** a la siguiente fase o a la **producción** y/u operaciones
- actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o fase, auditar el **éxito o fracaso del proyecto**, reunir las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la organización

# Factores de éxito

- Personal competente y experimentado
- Objetivos claramente definidos y acordados (DOU)
- Gerente de proyecto y personal dedicado exclusivamente al proyecto
- Plan de Proyecto completo
- Cronograma detallado
- Responsabilidad individual para cada entregable tanto internos como externos
- Definición de criterios de aceptación y criterios de calidad para cada entregable (el producto como entregable final y todos los entregables intermedios)
- Definición clara de canales de comunicación entre los participantes
- Seguimiento de la lista de items de acción
- Problemas detectados tempranamente y resueltos
- Revisión regular de las áreas de riesgos
- Subcontratistas tratados como parte del equipo
- Dependencias controladas (lo que debe hacer el cliente para que avance el proyecto)
- ...

# Elementos necesarios para el éxito



**Profesionalismo  
Capacitación**

**Métodos y Herramientas**

**Cultura Organizacional**

## El equipo del Proyecto

Un **EQUIPO** es un **grupo de individuos que trabajan en colectividad** para alcanzar un objetivo común con el que todos están comprometidos.

El **DIRECTOR** deberá trabajar mucho para conseguir el **compromiso de los miembros del equipo con el proyecto** y realmente conseguir que el grupo de individuos se convierta en un **equipo**.



# Declaración de la **MISIÓN**

Debe dar respuesta a estas tres preguntas:

¿Qué hacemos?

¿Para quién lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

**Antes, es útil que el equipo pase por un proceso en el que se responde a:**

- ✓ Identificar el **entorno** interno y externo del equipo
- ✓ Hacer una lista de todos los **interesados** del equipo
- ✓ Subrayar los **clientes del equipo** a partir de la lista de stakeholders
- ✓ Ver quiénes son los **tres interesados más importantes**: al menos uno de ellos debe ser el principal
- ✓ Hacer una lista de las **cosas** que los tres interesados más importantes **quieren del equipo**
- ✓ Enumerar **criterios del éxito** que se van a utilizar para **juzgar resultados** del equipo
- ✓ ¿Qué **hechos críticos** podrían producirse en el futuro que **afectarán** positiva o negativamente al **éxito del equipo**?

# Herramientas para Gestión de Proyectos

Para la Dirección de Proyectos **se requerirán métodos y herramientas** que permitan:

- Planificar
- Obtener información
- Controlar
- Gestionar los cambios
- Organizar

# Características a evaluar

1. **Planificación** de Proyectos
2. **Seguimiento** de proyectos y control de **cambios**
3. Administración de **documentos**
4. **Colaboración**
5. Gestión de **Configuraciones**
6. **Usabilidad**
7. Cuestiones técnicas de instalación, uso y mantenimiento

*Integración, Alcance y Cierre*

# Gestión de Alcance del Proyecto

## Gestión del **ALCANCE** de Proyectos

Incluye los **procesos** necesarios para garantizar que el **proyecto incluya todo** (y únicamente todo) el **trabajo requerido** para completarlo con éxito.

El **OBJETIVO PRINCIPAL** de la Gestión del Alcance del Proyecto es **definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye** en el proyecto.

## Procesos incluidos en la Gestión de Alcance

- ✓ Recopilar Requisitos
- ✓ Definir el Alcance
- ✓ Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
- ✓ Verificar el Alcance
- ✓ Controlar el Alcance

## Estructura de Desglose de Trabajo (**EDT o WBS**)

**Es una descomposición jerárquica,  
basada en los entregables del trabajo  
que debe ejecutar  
el equipo del proyecto para  
lograr los objetivos del proyecto  
y crear los entregables requeridos**

