

Proyecto - Diagrama de Red (CPM) y Diagrama de Gantt

Esquema de Red (valores por tarea)

Tarea	IT	Dur	FT	ITa	FTa	Holgura Total	Holgura Libre	Predecesoras	Sucesoras
A	1	2	2	7	8	6	0		H
B	1	4	4	5	8	4	0		F
C	1	2	2	7	8	6	2		F
D	1	3	3	1	3	0	0		F, G
E	1	9	9	4	12	3	0		J
F	5	3	7	9	11	4	4	B, C, D	I
G	4	8	11	4	11	0	0	D	I
H	3	5	7	9	13	6	0	A	K
I	12	4	15	12	15	0	0	F, G	L, M
J	10	6	15	13	18	3	0	E	M
K	8	3	10	14	16	6	6	H	N
L	16	1	16	16	16	0	0	I	N
M	16	2	17	19	20	3	0	I, J	O
N	17	7	23	17	23	0	0	K, L	
O	18	3	20	21	23	3	3	M	

Duración total del proyecto (Fin) = 23

Diagrama de Red (nodos unidos)

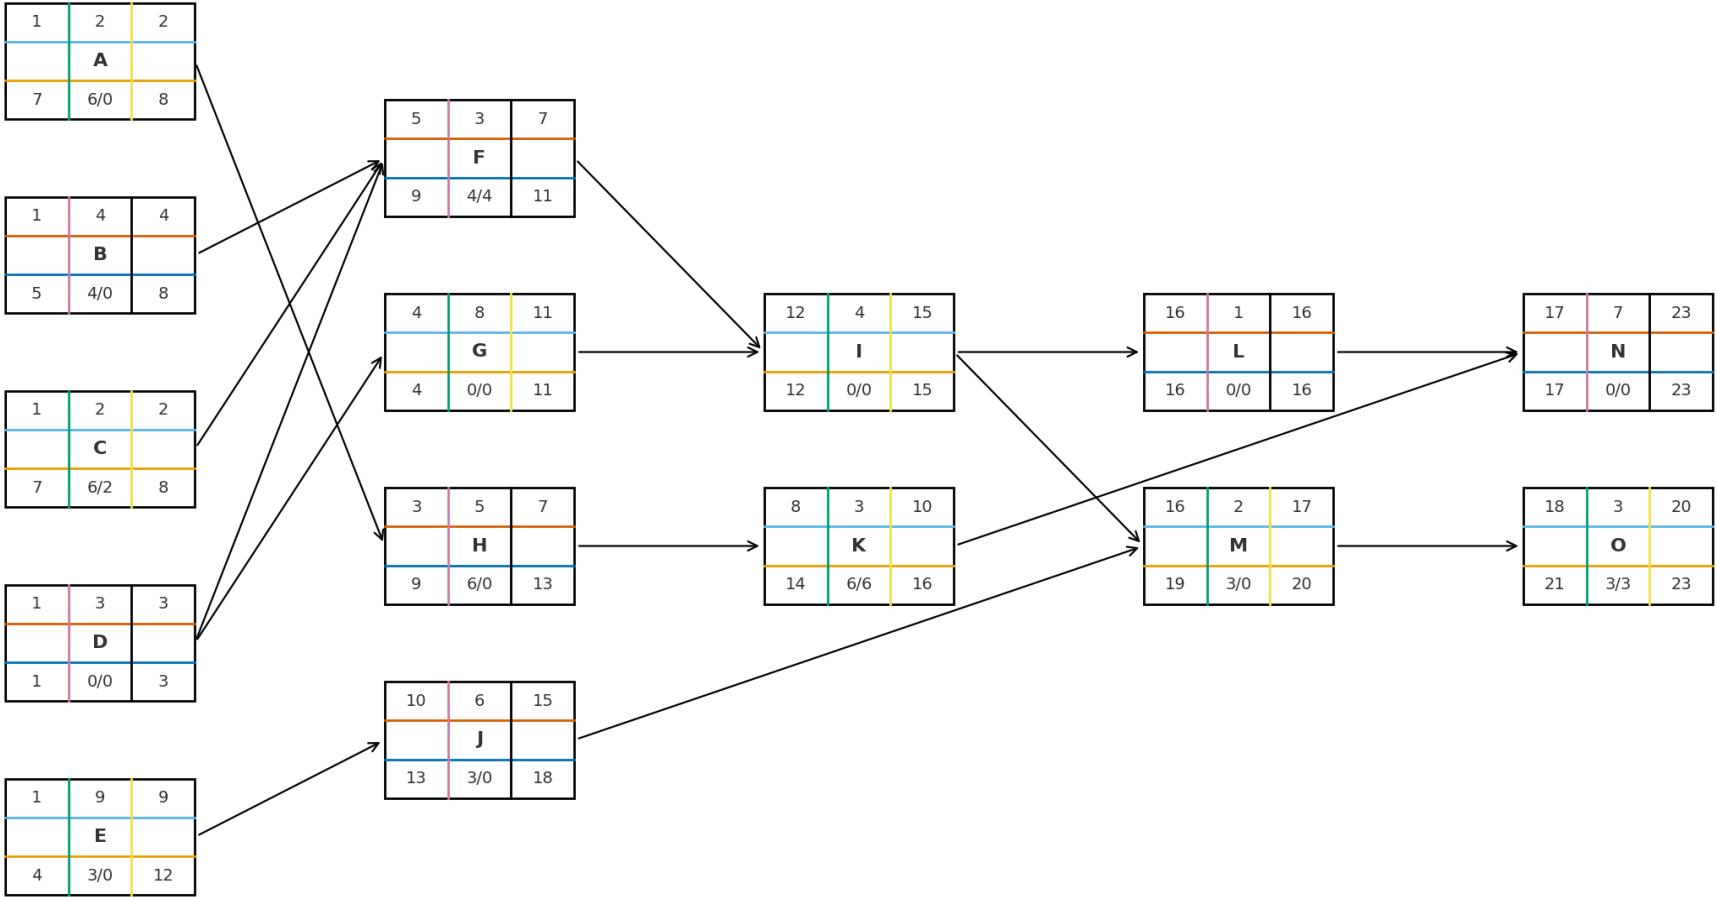


Diagrama de Gantt

Tarea	Inicio	Duración	Fin	Dependencias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	1	2	2		■	■																					
B	1	4	4		■	■	■	■																			
C	1	2	2		■	■																					
D	1	3	3		■	■	■																				
E	1	9	9		■	■	■	■	■	■	■	■	■														
H	3	5	7	A			■	■	■	■	■																
G	4	8	11	D				■	■	■	■	■	■	■	■												
F	5	3	7	B, C, D					■	■	■																
K	8	3	10	H								■	■	■													
J	10	6	15	E										■	■	■	■	■	■								
I	12	4	15	F, G												■	■	■	■								
L	16	1	16	I																■							
M	16	2	17	I, J																■	■						
N	17	7	23	K, L																	■	■	■	■	■	■	■
O	18	3	20	M																		■	■	■			
